

## 新庁舎進捗

(工事進捗、免震オイルダンパー関係、仮囲いディスプレイ等)


平成30年12月11日 嘉麻市新庁舎建設設置本部会議

(事務局：嘉麻市 地域活性推進課)

## 工事進捗

### ◆基礎・免震層・地下躯体工事（7月）

（主な内容）免震下部基礎鉄筋組立工事、掘削工事

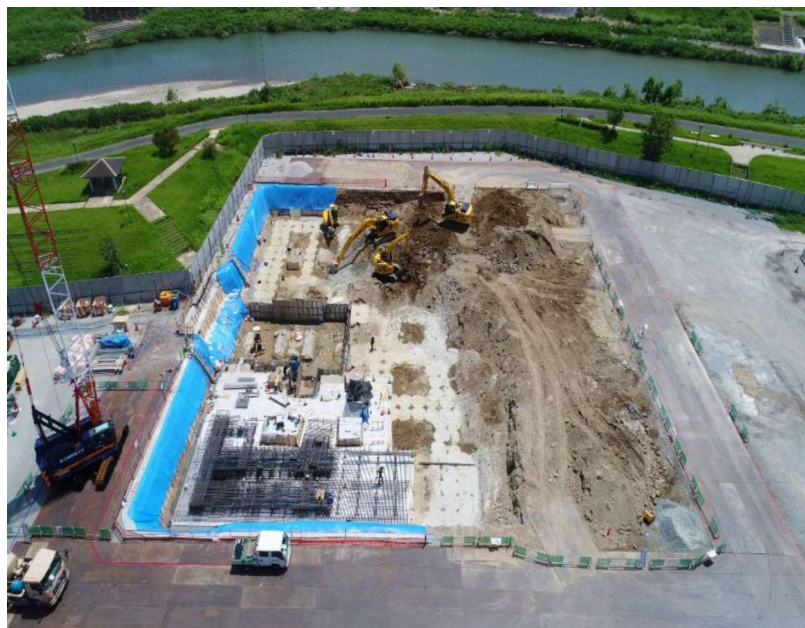

新庁舎西側工事進捗状況




新庁舎南側工事進捗状況


## 工事進捗

### ◆基礎・免震層・地下躯体工事（8月）

（主な内容）免震下部基礎型枠組立工事・免震下部基礎コンクリート工事

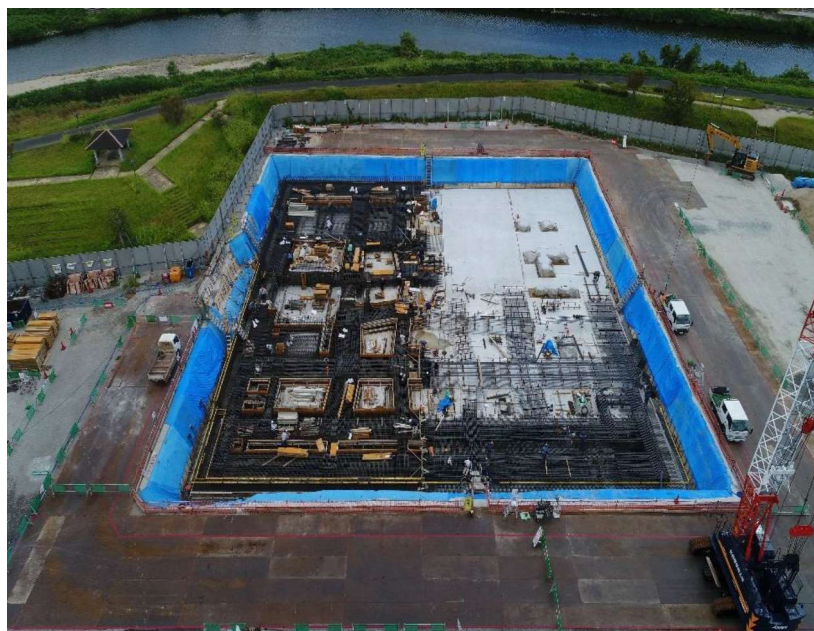

新庁舎西側工事進捗状況

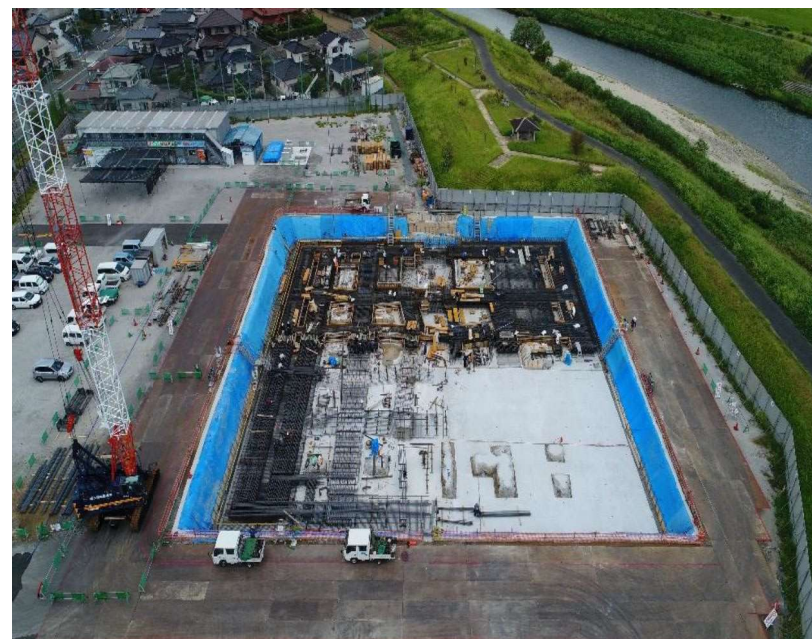


新庁舎南側工事進捗状況

## 工事進捗

### ◆基礎・免震層・地下躯体工事（9月）

（主な内容）免震層土間コンクリート工事・擁壁コンクリート工事

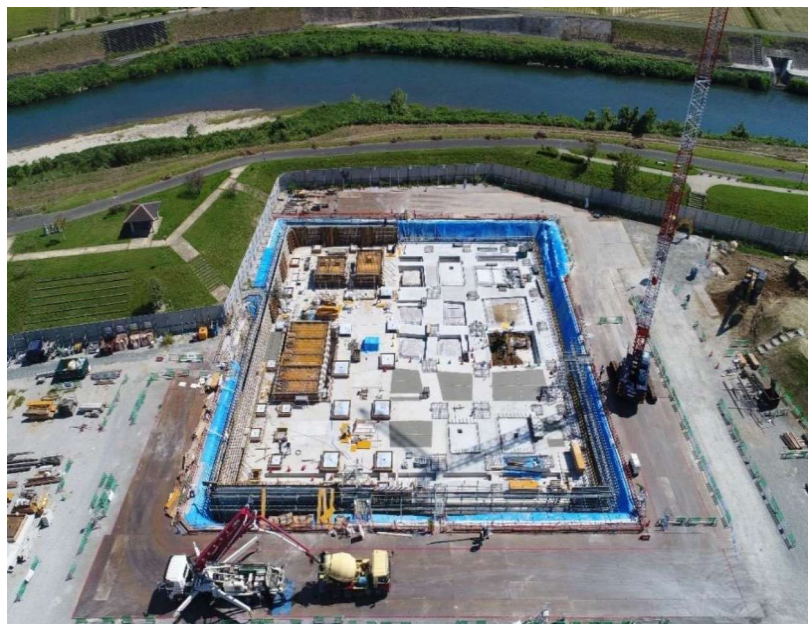

新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

## 工事進捗

### ◆基礎・免震層・地下躯体工事（10月）

（主な内容）免震装置ゴム据付工事、免震上部基礎型枠組立工事



新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

## 免震オイルダンパー関係

### ◆ 免震オイルダンパーとは・・・

オイルの粘性や金属の延性、摩擦の抵抗を利用した装置で、建物の重量を支える役目はせず、地震時の建物の揺れ幅を抑える装置。

免震ゴムのみでは建物の揺れを抑えることはできない。

### ◆ 免震オイルダンパーの不適切行為について

**平成30年10月17日**

県建築指導課から KYB 株式会社及びカヤバシステムマシナリー株式会社が製造し大臣認定等の内容に適合しない免震オイルダンパーが設置されているとの報道が10月16日になされ、性能検査の記録データの書き換え行為により、基準値を外れた製品の製造・出荷が行われているとの情報提供あった



この情報を受け・・・

(株)久米設計と(株)浅沼組に対し、納品予定の免震オイルダンパーに関する情報収集を依頼するとともに、10月25日納品予定であった免震オイルダンパーについて、安全性等が確認されるまで納品延期を指示

**平成30年11月現在**

納品予定の免震オイルダンパーについては、国土交通大臣認定品の減衰性能基準値誤差±15%の許容基準に対し、本市納品分については、国基準より厳しい減衰性能基準値誤差±10%を指示しており、現在、第三者機関において再度検査を実施している。



# 仮囲いディスプレイ（ホームページ掲載分）

高森市役所  
新庁舎建設現場

かましちゃん仮囲いステッカー貼付作業  
 嘉麻市立の小学6年生のみなさんのご協力のもと、無事**完成**しました！！

**『仮囲い』って何？**

新庁舎を建設している工事現場の国道側に、工事現場内に無断で入ることのないように安全を確保するため設置されているものです。

かましちゃんと大きな「KAMA」ロゴがデザインされた仮囲いですが、さくらの花びらをモチーフにしたステッカーを貼る事で完成されます

さくらの花びらモチーフのステッカー

貼付後、このようになりました



さくらの花びらが舞っているようですね！



ここで！  
 今年度卒業する  
 嘉麻市立の8小学校の6年生に  
 メッセージを記入してもらいました！！

**メッセージ内容**

- 新庁舎建設現場で働いている作業員のみなさんへの応援メッセージ
- 将来の嘉麻市に望むこと



貼付作業のお手伝いをいただいた福原西小学校のみなさん





新庁舎イメージ



外観（西側）  
 外観（遊覧川側）  
 4階  
 1階

作業員の方々もとても喜ばれていました。  
 ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました！！

嘉麻市新庁舎建設工事 スケジュール

時期	平成30年度				平成31年度			
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
準備工、基礎工								
躯体工								
内装仕上、外構								
美装、検査等								



## 嘉麻市新庁舎引越関連整備等 スケジュール

(・引越関係 ・電算関係 ・職員駐車場関係 ・什器関係等)

時期	平成30年度				平成31年度			
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
関係課検討・協議	→							
予算等諸準備				→				
実施					→			

※1：新庁舎建設工事以外の関連整備に関するスケジュール等

※2：詳細については各所管課において検討調整中
